



工程's 新バージョン「工程's9」のリリース、新機能のお知らせ

工程's をサクサク使いこなすための**基本操作**や、知っていると役立つ**ちょっとした小技**をメールマガジン形式でご紹介します。

第19回の今回は工程's 新バージョン『**工程's9**』リリースのお知らせ、及び**新機能のご紹介**です。

工程's の新バージョン『工程's9』が新たにリリースされました。以下の鹿島建設株式会社専用 HP の「工程's インストーラダウンロード」より、ダウンロードすることが可能です。

<https://kajima-kouteizu.info/webi/>

インストールにつきましては、以下の導入マニュアルをご参照ください

(鹿島建設株式会社 社員ユーザー様)

<https://kajima-kouteizu.info/kouteizu-manual.pdf>

(JV 構成会社 社員ユーザー様)


https://kajima-kouteizu.info/jv/kouteizu-manual_jv.pdf

- ※ 工程's9 インストール時、旧バージョンにあたる工程's8 を既にインストールされている場合、自動で工程's8 はアンインストール・削除されます。
- ※ 工程's9 の**ライセンスキー・プロテクトキー**は、工程's8 と異なります。**鹿島建設社員ユーザー様は専用 HP からの再取得**、**JV 構成会社社員ユーザー様は**鹿島建設社員様による**工程's 使用の再申請**が必要となります。

追加・強化機能

1. バーのポップアップ画面での備考編集

作業バー、グループバー、マイルストーンの選択時に表示されるポップアップ画面で、備考が編集できるようになりました。特定の備考欄へ、スピーディーに情報を入力することができ、工程表の作成・更新に便利です。

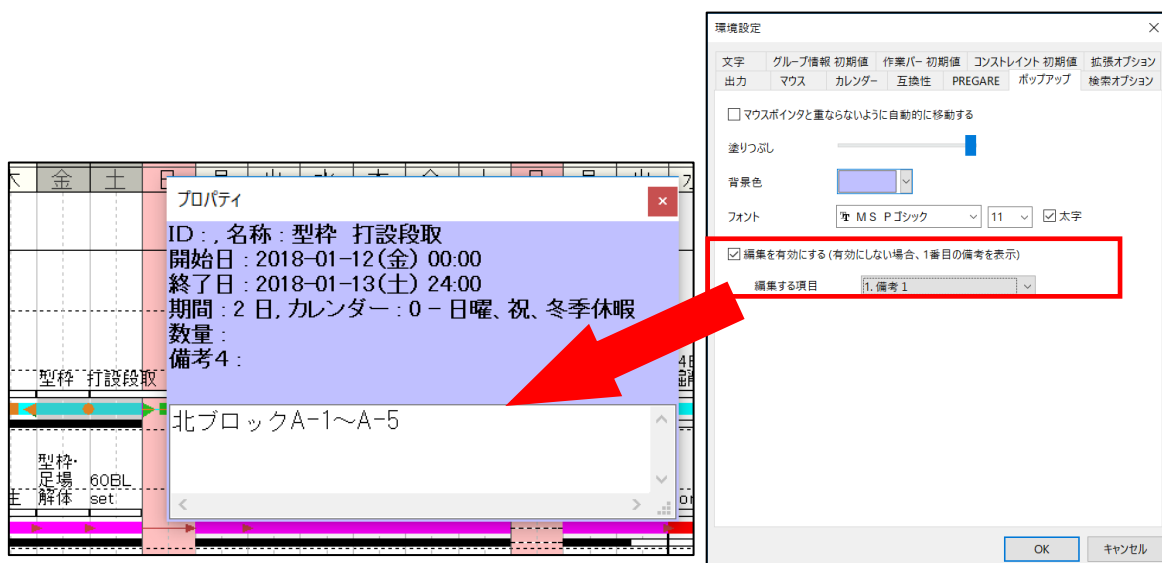

[編集]> [環境設定]> [にて、ポップアップ画面での編集を有効にすると、編集する項目（備考 1～備考 10）を設定できます。

2. バーの検索機能の強化

作業バーの検索機能を強化し、より詳細な検索ができるようになりました。特に、初期計画と最新計画が異なる場合、遅延が発生している工程を抽出しやすくなりました。

(1)バーの種類

作業バーに加え、**グループバー**、**マイルストーン**を検索できるようになりました。

(2)開始・終了

開始・終了の日時（年、月、日、時、分）または、時刻（時、分）のみを指定して検索できるようになりました。これにより、例えば**昼間作業のみ（8:00～17:00）**や、**夜間作業のみ**などの作業バーの絞り込みが可能になりました。

(3)遅れ(期間延長、着手遅れ)

初期計画に対して最新計画の**期間が延びたバー**や、**開始日が遅くなったバー**を検索できるようになりました。

(4)バーの期間

バーの期間により、5 日以上 10 日以下のバーや、1 時間以下のバーなどが検索できるようになりました。

※ 期間の単位（日、時間、分）は、工程's のオプション設定の期間の表示単位に合わせて自動的に変わります。

「Tips」

工程's 8 とのファイルの互換性について

工程's 8 で作成した工程's ファイルは、工程's 9 で参照、更新できます。
工程's 9 で作成した工程's ファイルは、工程's 8 で参照、更新できます。
（但し、工程's 8 では工程's 9 の新機能はご利用いただけません。）

次回は工程's9 に追加された新しいツールについてご紹介します！
