

## 工程's 9 新機能のご紹介

工程's をサクサク使いこなすための**基本操作**や、知っていると役立つ**ちょっとした小技**をメールマガジン形式でご紹介します。

第21回の今回は工程's 新バージョン「**工程's 9 新機能のご紹介 外部ツール編**」です。

### 1. 作業バーの並べ替えツール

工程表全体または、選択したグループおよび配下のグループにて、条件を指定することにより、作業バーを昇順/降順と並べ替えができます。

#### ◆操作手順

「工程表全体を対象とする場合」と「選択したグループおよび配下のグループのみを対象とした場合」の2通りで設定をすることができます。

・**工程表全体**：[ツール]メニュー>[作業バーの並べ替え]を選択

・**選択したグループおよび配下のグループ**：グループ名称エリア上で右クリックメニューから[作業バーの並べ替え]を選択

工程表全体対象の場合、ビューの選択ができます。  
※グループ対象の場合、グレー表示になります。

並べ替え期間を選択します。「週ごと」の場合、  
「週の開始日」を設定できます。

日程や備考 1~10 による並べ替え期間を選択します。

|    |           | 1 | 2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 | 8 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13 | 14 |
|----|-----------|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|----|
|    |           | 日 | 月 | 火   | 水   | 木   | 金   | 土 | 日 | 月   | 火   | 水   | 木   | 金  | 土  |
| 1区 | Aサンプルグループ |   |   | 作業A | 作業B | 作業C | 作業D |   |   | 作業A | 作業B | 作業C | 作業D |    |    |
|    | Bサンプルグループ |   |   |     |     |     |     |   |   | 作業A | 作業B | 作業C | 作業D |    |    |
| 2区 | Cサンプルグループ |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |    |    |
|    | Dサンプルグループ |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |    |    |

週ごとで並べ替えた場合  
(週の開始日=月曜日、  
キー=開始日、順序=昇順)

全期間で並べ替えた場合  
(全期間、キー=開始日、順序=昇順)

※本機能をご利用の際、指定した期間内で1行に複数バーを配置していると、並べ替え実行後、工程表の行数が増える場合があります。


※開始日や期間全体が編集期間外となるバーの並べ替えは行いません。

## 2. 初期計画クリアツール

設定済みの初期計画を削除することができます。

### ◆ 操作手順

[ツール]メニュー>[初期計画クリア]を選択します。削除したいバーのタイプを選択すると、選択したバータイプの初期計画がすべて削除されます。

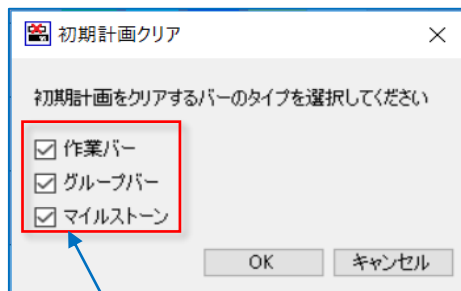

初期計画をクリアしたいバーのタイプを選択します。

### ◆ 実行前 ※作業バーで設定した場合




### ◆ 実行後



※編集期間外に配置されている作業バー、グループバー、マイルストーンの初期計画は削除されません。

## 3. 供給資源量一括設定ツール

山積みグラフの供給資源量設定を、指定した値に一括で設定できます。



供給資源量で、設定したい値を選択します。

既に供給資源量が設定されている資源への反映を選択できます。

### ◆ 供給資源量を「2」で設定した場合

